

【検査報告写真】



外観	
対象箇所	建物正面(1階)
備考	木造軸組1階建。陸屋根仕様。外壁材はモルタルリシン吹き付け仕上げ。




①-1	
対象箇所	1階リビング壁部
確認項目	雨漏り痕確認
備考	雨漏り痕箇所の事前確認。(壁面に雨漏り確認の為の点検口あり)




①-2	
対象箇所	1階リビング壁部
確認項目	雨漏り痕確認
備考	雨漏り痕箇所の事前確認。



①-3	
対象箇所	1階リビング壁部
確認項目	雨漏り検査
備考	1階リビングの上階になります屋上より、外壁部を放水にて検査。

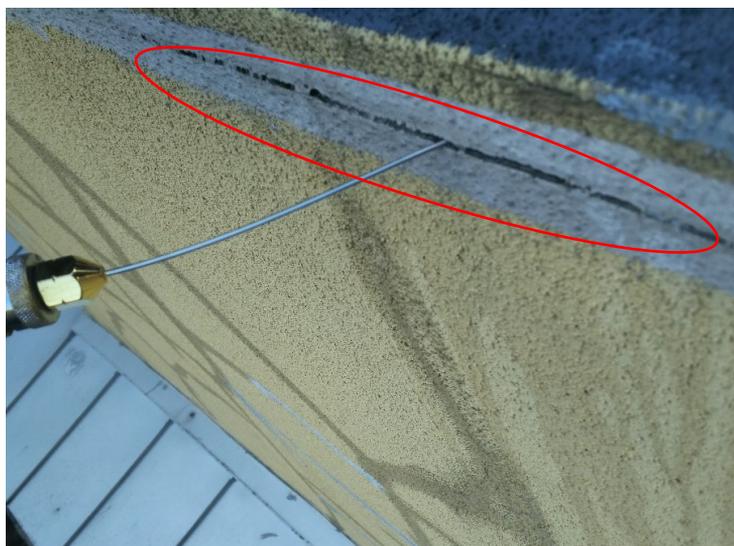

①-4	
対象箇所	1階リビング壁部
確認項目	雨漏り検査
備考	外壁モルタルにクラックが見受けられます。

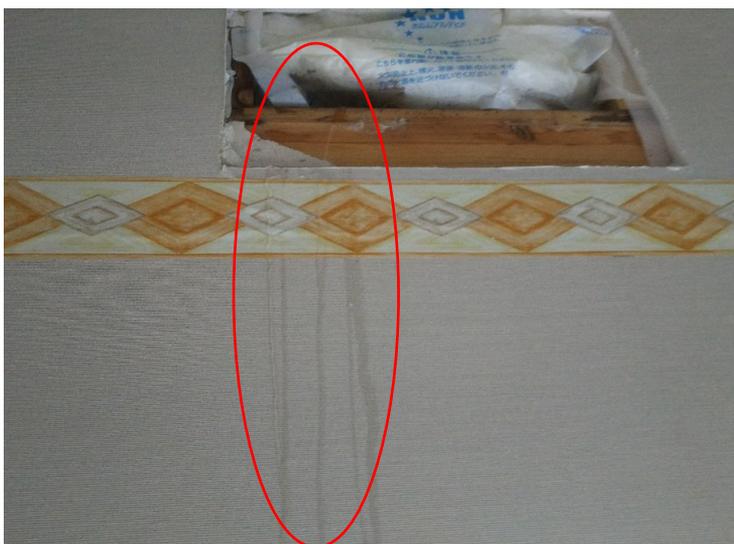

①-5	
対象箇所	1階リビング壁部
確認項目	雨漏り発生確認
備考	壁面点検口の内部構造体(梁上端)より漏水確認。
